


STATUS	% PLANEJADO	% CONCLUÍDO	CAPEX PLANEJADO	CAPEX REALIZADO	CAPEX PROJETADO
	17%	20%	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

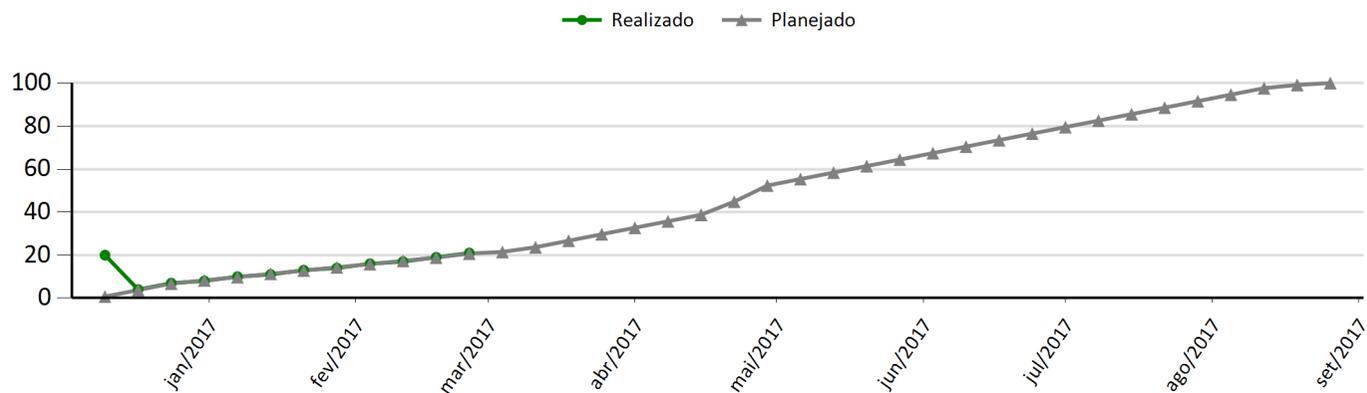

AVALIAÇÃO GERAL

- **Corrida 10K:** os resultados foram alcançados sem grandes desvios.

A primeira corrida de 10K foi alcançada com quase um mês de antecedência, porém o resultado não foi repetido nos treinos seguintes.

Foi necessário um maior esforço para que o resultado fosse mantido e consolidado.

PONTOS CRÍTICOS

- Dores no joelho
- Alinhamento dos compromissos profissionais e pessoas com o treino.

PRÓXIMOS PASSOS

- Alcançar a marca dos 15KM

ENTREGAS

Prazo	Entrega	Início (Atual)	Término (Atual)	% Real	Início (Planejado)	Término (Planejado)	% Plan.	Atraso (Dias)
	Avaliação física	12/12/2016	23/12/2016	100%	12/12/2016	23/12/2016	100%	→ 0
	Corrida 5K	07/12/2016	20/12/2016	100%	07/12/2016	21/12/2016	100%	→ -1
	Corrida 10K	22/12/2016	28/02/2017	90%	23/12/2016	01/03/2017	90%	→ -1
	Corrida 15K	02/03/2017	01/04/2017	0%	06/03/2017	01/04/2017	0%	→ 0
	Corrida 18K	03/04/2017	29/04/2017	0%	03/04/2017	29/04/2017	0%	→ 0
	Corrida 21K	01/05/2017	27/05/2017	0%	01/05/2017	27/05/2017	0%	→ 0
	Organização da Viagem	17/04/2017	28/04/2017	0%	17/04/2017	28/04/2017	0%	→ 0
	Pré-maratona	29/05/2017	12/08/2017	0%	29/05/2017	12/08/2017	0%	→ 0
	Dia D	18/08/2017	20/08/2017	0%	18/08/2017	20/08/2017	0%	→ 0

STATUS



% PLANEJADO

17%

% CONCLUÍDO

20%

CUSTO PLANEJADO


R\$0,00

CUSTO REALIZADO

R\$0,00

CAPEX PROJETADO

R\$0,00

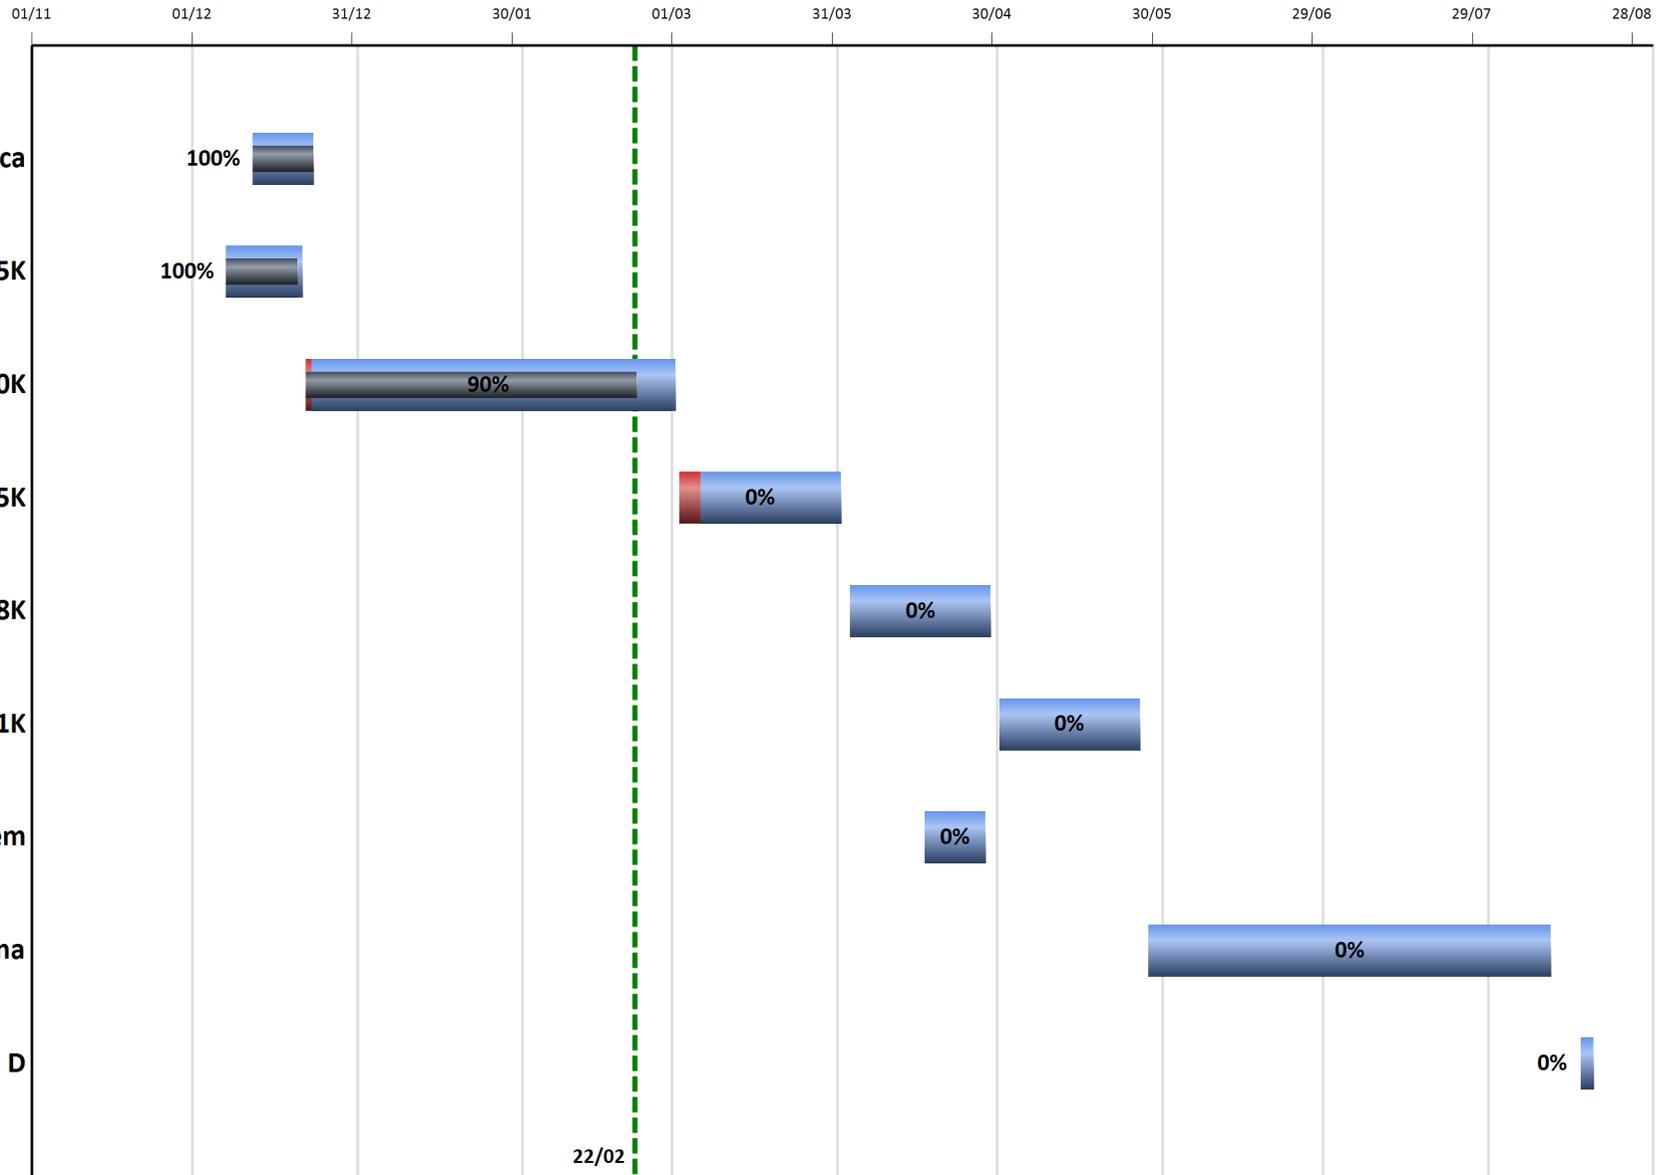

Atual

Linha de Base

Evolução no Prazo

Evolução com risco de atraso

Evolução com atraso

STATUS



% PLANEJADO

17%

% CONCLUÍDO

20%

INÍCIO

07/12/2016

TÉRMINO

20/08/2017

RISCO

ATIVIDADE

INÍCIO

TÉRMINO

STATUS

PRÓXIMOS PASSOS

DATA ALVO

RESPONSÁVEL



Impacto Baixo



Impacto Médio



Impacto Alto



Impacto Muito Alto



Job Stopper

